



ESTIMACIÓN: 1110 HOJA 1 DE 3
 PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
 MONTO CONTRATADO: \$ 190,022.04
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-F08-19-ELECT-002
 FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
 M. AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
 TONTOVA ED. HACIENDA DELIBERANTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 3 POSTES PARA 2 VIVIENDAS EN CALLE LUCERO, COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS
 UBICACIÓN: COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FISE 2019

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 3 POSTES PARA 2 VIVIENDAS EN CALLE LUCERO, COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS	1.00	LOTE	\$ 190,022.04	\$ 190,022.04	
TOTAL DE ESTIMACION FINIQUITO					\$ 190,022.04	


ESTIMACION FINIQUITO	\$163,812.10
IVA 16%	\$26,209.94
SUBTOTAL	\$190,022.04
DEDUCCIONES:	
AMORT. DE ANTICIPO	\$0.00
0.2% Capadit. Trab. I.C.L.C.	\$0.00
0.2% M.A.C.	\$0.00
TOTAL	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
IVA 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

ANTICIPO OTORGADO:	\$ 57,006.61	0.2% Capadit. Trab. I.C.L.C.	\$ 327.62	0.2% M.A.C.	\$ 327.62	RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:	
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 57,006.61	AMORT. A LA FECHA:	\$ 327.62	AMORT. A LA FECHA:	\$ 327.62		ESTIMADO A LA FECHA:
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -	AMORT. EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -	AMORT. EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -		ESTA ESTIMACIÓN:
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -	POR AMORTIZAR:	\$ -	POR AMORTIZAR:	\$ -		SALDO POR EJECER:


RESIDENTE DE OBRA

L.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:		VIVO		FOJA 2 DE 9		RESUMEN DE FINIQUITO				 OBRAS: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 3 POSTES PARA 2 VIVIENDAS EN CALLE LUCERO, COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS UBICACIÓN: COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC. PROGRAMA: RSE 2019		
PERIODO:		DEL 04 DE NOVIEMBRE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019		MONTA: 190,022.04								
MONTA CONTRATADO:		\$		190,022.04								
NO. DE CONTRATO:		MSO-DOS-SOM-RSE-19-ELECT-002										
FECHA:		30 DE DICIEMBRE DE 2019										
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN												
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO			
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	0.00	3.00	\$ 11,919.00	\$ -	\$ 36,758.80			
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	5.00	5.00	0.00	5.00	\$ 721.71	\$ -	\$ 3,605.00			
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	5.00	5.00	0.00	5.00	\$ 295.02	\$ -	\$ 1,475.10			
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	20.00	20.00	0.00	20.00	\$ 121.77	\$ -	\$ 2,435.40			
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2B5; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	16.00	16.00	0.00	16.00	\$ 334.62	\$ -	\$ 5,353.92			
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	0.00	4.00	\$ 664.25	\$ -	\$ 2,657.16			
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 754.28	\$ -	\$ 1,528.56			
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	0.00	4.00	\$ 526.08	\$ -	\$ 2,106.72			
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 295.02	\$ -	\$ 590.04			
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 128.70	\$ -	\$ 257.40			
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA Y BASE B8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 1,075.14	\$ -	\$ 2,150.28			
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	40.00	40.00	0.00	40.00	\$ 84.05	\$ -	\$ 3,362.00			
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 1,339.47	\$ -	\$ 2,678.94			
04-ELECT-037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PICABLE AG 3/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 129.69	\$ -	\$ 1,037.52			
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PICSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 121.77	\$ -	\$ 730.62			
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 10-10; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	20.00	20.00	0.00	20.00	\$ 125.78	\$ -	\$ 2,415.60			
04-ELECT-041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2*1)1/8-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	114.00	114.00	0.00	114.00	\$ 237.80	\$ -	\$ 27,086.40			
04-ELECT-042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1*1)1/8-8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	200.00	200.00	0.00	200.00	\$ 45.51	\$ -	\$ 9,102.00			
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 334.62	\$ -	\$ 669.24			
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	0.00	3.00	\$ 1,130.56	\$ -	\$ 3,391.74			
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	15.00	15.00	0.00	15.00	\$ 714.78	\$ -	\$ 10,721.70			
04-ELECT-048	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	0.00	3.00	\$ 526.08	\$ -	\$ 1,580.04			
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 60W MULTI Y 120/204; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	0.00	3.00	\$ 16,888.43	\$ -	\$ 50,065.29			
								\$ -	\$ 171,783.02			


 LSC JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 LSC KEVIN JESUS BARRA SERRANO
 SUBSIDENTENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: UNO HOJA 4 DE 9
 PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
 MONTO CONTRATADO: \$ 190,022.04
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-002
 FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 3 POSTES PARA 2 VIVIENDA EN CALLE LUCERO, COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS
 UBICACIÓN: COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS
 MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
 PROGRAMA: FISE 2019

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON	CALLE LUCERO	POSTE 1				1.00		1.00	pza	
			POSTE 2				1.00	1.00	pza		
			POSTE 3				1.00	1.00	pza		
								TOTAL	3.00	pza	
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1				2.00		2.00	pza	
			POSTE 2				2.00	2.00	pza		
			POSTE 3				1.00	1.00	pza		
								TOTAL	5.00	pza	
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1				2.00		2.00	pza	
			POSTE 2				2.00	2.00	pza		
			POSTE 3				1.00	1.00	pza		
								TOTAL	5.00	pza	
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1				7.00		7.00	pza	
			POSTE 2				7.00	7.00	pza		
			POSTE 3				6.00	6.00	pza		
								TOTAL	20.00	pza	
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1				6.00		6.00	pza	
			POSTE 2				6.00	6.00	pza		
			POSTE 3				4.00	4.00	pza		
								TOTAL	16.00	pza	
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1				2.00		2.00	pza	
			POSTE 2				2.00	2.00	pza		
			POSTE 3								
								TOTAL	4.00	pza	
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1				1.00		1.00	pza	
			POSTE 2				1.00	1.00	pza		
			POSTE 3								
								TOTAL	2.00	pza	
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1				4.00		4.00	pza	
			POSTE 2								
			POSTE 3								
								TOTAL	4.00	pza	
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1				1.00		1.00	pza	
			POSTE 2				1.00	1.00	pza		
			POSTE 3								
								TOTAL	2.00	pza	

ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA
 RESIDENTE DE OBRA.

L.S. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.



ESTIMACIÓN: UNO HOJA 5 DE 9
 PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
 MONTO CONTRATADO: \$ 190,022.04
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-002
 FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 3 POSTES PARA 2 VIVIENDA EN CALLE LUCERO, COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS
 UBICACION: COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FISE 2019

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD	
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL		
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1									
			POSTE 2									
			POSTE 3									
							2.00		2.00		pza	
									TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA Y BASE RB; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1									
			POSTE 2									
			POSTE 3									
							1.00		1.00		pza	
							1.00		1.00		pza	
									TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1									
			POSTE 2									
			POSTE 3									
							20.00		20.00		ml	
									TOTAL		20.00	ml
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1									
			POSTE 2									
			POSTE 3									
							1.00		1.00		pza	
							1.00		1.00		pza	
									TOTAL		40.00	ml
04-ELECT-037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1									
			POSTE 2									
			POSTE 3									
							4.00		4.00		pza	
							4.00		4.00		pza	
									TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1									
			POSTE 2									
			POSTE 3									
							2.00		2.00		pza	
							2.00		2.00		pza	
									TOTAL		8.00	pza
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1									
			POSTE 2									
			POSTE 3									
							8.00		8.00		pza	
							8.00		8.00		pza	
									TOTAL		6.00	pza
04-ELECT-041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1									
			POSTE 2									
			POSTE 3									
							38.00		38.00		pza	
							38.00		38.00		pza	
									TOTAL		20.00	pza
04-ELECT-042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1									
			POSTE 2									
			POSTE 3									
							66.00		66.00		pza	
							66.00		66.00		pza	
									TOTAL		114.00	pza
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1									
			POSTE 2									
			POSTE 3									
							2.00		2.00		kg	
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE LUCERO	POSTE 1									
			POSTE 2									
			POSTE 3									
							1.00		1.00		pza	
							1.00		1.00		pza	
									TOTAL		2.00	kg
							1.00		1.00		pza	
							1.00		1.00		pza	
									TOTAL		3.00	pza

AND. JUAN RINCÓN ACOSTA
 RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.




ESTIMACIÓN: UNO HOJA 7 DE 9
 PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
 MONTO CONTRATADO: \$ 190,022.04
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-50M-FISE-19-ELECT-002
 FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 3 POSTES PARA 2 VIVIENDAS EN CALLE LUCERO, COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS
 UBICACIÓN: COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FISE 2019

CROQUIS DE OBRA

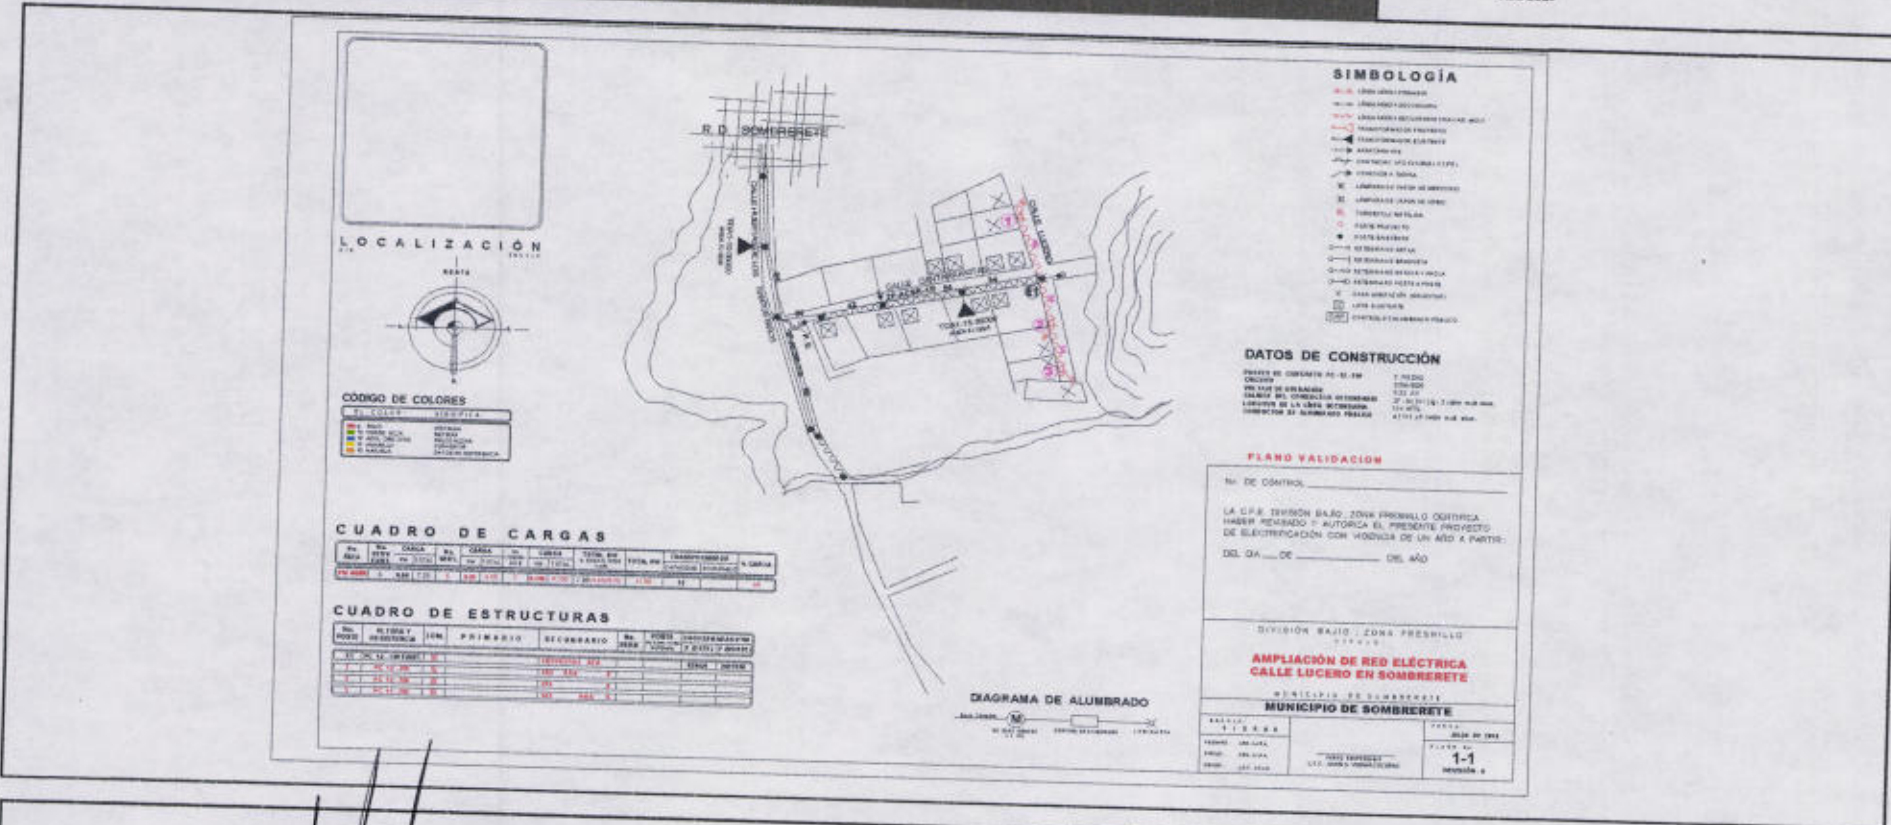

[Signature]
 ING. JUAN RIVERA ACOSTA
 RESIDENTE DE OBRA.

[Signature]
 I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

[Signature]
 ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.



ESTIMACIÓN: UNO HOJA 8 DE 9
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 190,022.04
Nº. DE CONTRATO: M50-005-SOM-FIS-19-ELECT-002
FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 3 POSTES PARA 2 VIVIENDAS EN CALLE LUCERO, COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS
UBICACIÓN: COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FISE 2019

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA




ARLE JAVIER ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA.


LSC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.


ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

ESTIMACIÓN: UNO HOJA 9 DE 9

PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019

MONTO CONTRATADO: \$

190,022.04

Nº. DE CONTRATO:

MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-002

FECHA:

10 DE DICIEMBRE DE 2019

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 3 POSTES PARA 2 VIVIENDAS EN CALLE LUCERO, COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS

UBICACIÓN: COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.


PROGRAMA: FISE 2019

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA




ING. JUAN RIVERA ACOSTA,
RESIDENTE DE OBRA.


L.SC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.


ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.
